



ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ



АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020

30 ноември 2022 г.
гр. Стара Загора

Обща информация за ОПРР 2014 – 2020

- ✓ По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) са публикувани 24 процедури с общ размер на предоставените средства (БФП+ФИ) 3,14 млрд. лв. или 100% от бюджета на програмата;
- ✓ Сключени са **765** договора с общ размер на договорени средства (БФП+ФИ) 3,065 млрд. лв. или 97,4% от бюджета на програмата;
- ✓ Изпълнени проекти по **527** ДБФП с общ размер на предоставените средства (БФП+ФИ) 1,347 млрд. лв. или 42,8% от бюджета на програмата;
- ✓ В периода **23.03-30.11.2022** г. са сключени 12 ДБФП с бенефициенти по ПО 1, 2 и 9 с общ размер на предоставените средства (БФП+ФИ) 143,5 млн. лв. или 4,6% от бюджета на програмата.

Приключили са **527** договора;
238 договора са в процес на изпълнение.





Сключени договори по приоритетни оси на ОПРР



- 258 договора по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ с общ размер на предоставените средства БФП+ФИ **1,505 млрд. лв.**, в т. ч. сключено финансово споразумение с Фонд на фондовете на стойност **271,2 млн. лв.** (97,6%) от бюджета на ПО1);
- 229 договора по ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ с общ размер на БФП **212,9 млн. лв.** (98,2%);
- 67 договора по ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“ с общ размер на БФП **215 млн. лв.** (93,7%);
- 3 договора по ПО 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с общ размер на БФП **223,9 млн. лв.** (100%);
- 81 договора по ПО 5 „Регионална социална инфраструктура“ с общ размер на БФП **68,8 млн. лв.** (81,9%);
- 16 договора по ПО 6 „Регионален туризъм“ с общ размер на БФП – **96 млн. лв.** Сключено финансово споразумение с Фонд на фондовете на стойност **98,5 млн. лв.** (98,7% от бюджета на ПО 6);
- 35 договора по ПО 7 „Регионална пътна инфраструктура“ с общ размер на БФП **415,1 млн. лв.** (98,2%);
- 73 договора по ПО 8 „Техническа помощ“ с общ размер на БФП **100,3 млн. лв.** (97,9%);
- 2 договора по ПО 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ с общ размер на БФП **129,3 млн. лв.** (100%).

ПИСМЕНИ ПРОЦЕДУРИ И СЪОБЩЕНИЯ до КН на ОПРР

1. Процедурата се провежда през периода 11.05 – 26.05.2022 г. на основание чл.15, ал. 2 от Вътрешните правила за работа на КН

Решение на КН:

➤ Комитетът за наблюдение одобрява Годишен доклад за изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. за 2021 г. и дава мандат на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 да изпрати финалния вариант в съответствие с чл. 125 от Регламент (ЕС) №1303/2013. КН на ОПРР 2014-2020 одобрява актуализация на Решения № 2 и 3 от проведена писмена процедура на КН на 9 ноември 2021 г. и Решение № 5 от Деветнадесетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020.

2. Процедурата се провежда през периода 13.10 – 27.10.2022 г. на основание чл.15, ал. 2 от Вътрешните правила за работа на КН

Решения на КН:

- На основание чл. 110 от Регламент (ЕС) №1303/2013, КН на ОПРР 2014-2020 одобрява предложеното изменение на План за оценка на Програмата
- КН на ОПРР 2014-2020 дава мандат на РУО на програмата да предприеме необходимите стъпки за изпълнение одобреното изменение на Плана за оценка.

16 Съобщения до КН:


- за удължаване на срока за изпълнение на договори над максимално допустимия, заложен в Насоките за кандидатстване по съответните процедури

НЕРЕДНОСТИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ


Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

<u>Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020</u>	
Брой сигнали	2112 бр.
Прекратени сигнали	262 бр.
Сигнали в обработка	71 бр.
Установени нередности	1754 бр. регистрирани в регистър „Нередности“
Размер на наложените финансови корекции	154 251 376,17 лв.
Размер на реално удържани финансови корекции от УО	118 819 748,01 лв.

- Към **10.11.2022 г.** – регистрирани 1083 съдебни административни производства против актове, издадени от РУО:
- С окончателно влязло в сила Решение на компетентния съд са завършили 910 броя съдебни производства,
- в 785 от които е отсъдено в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
- общо 125 са загубените дела, 10 от които са дела за отказ на верификация и плащане.


 За допълнителна информация по отношение на актуалната степен на изпълнение на програмата може да посетите страницата на <https://www.eufunds.bg/>

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРР

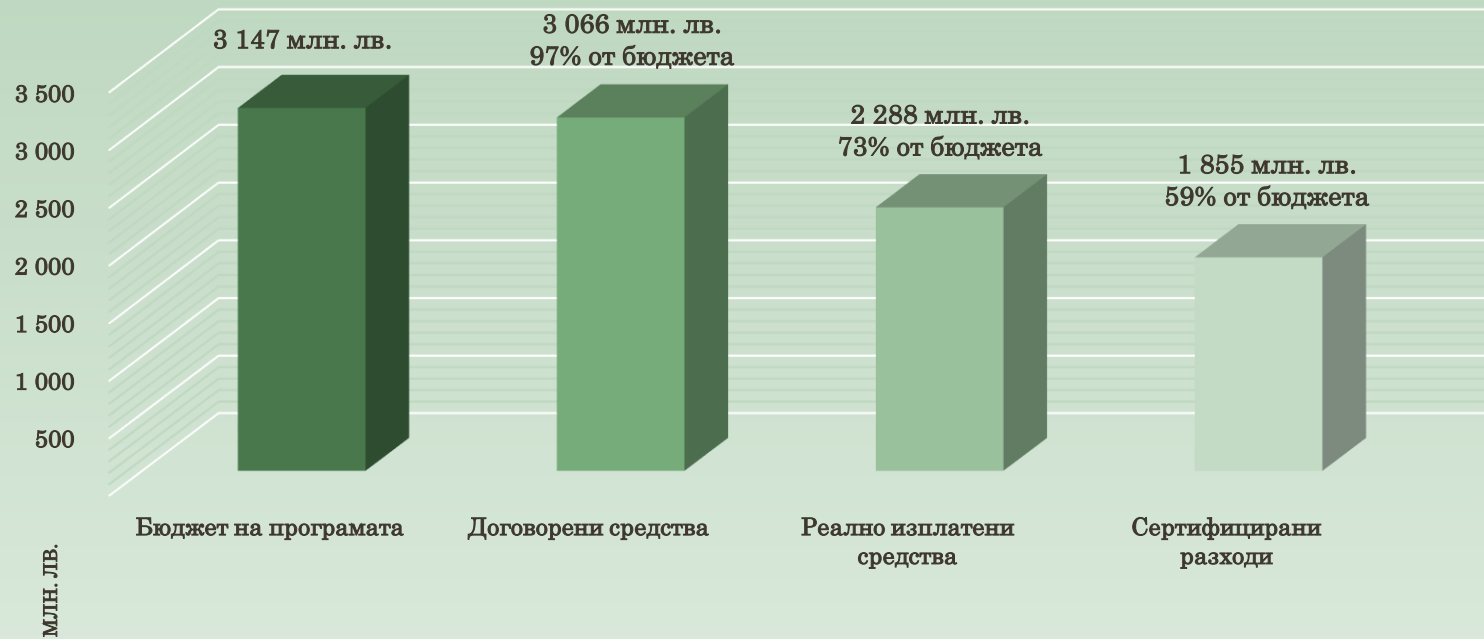

За допълнителна информация по отношение на актуалната степен на изпълнение на програмата може да посетете страницата на <https://www.eufunds.bg/>

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРР ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

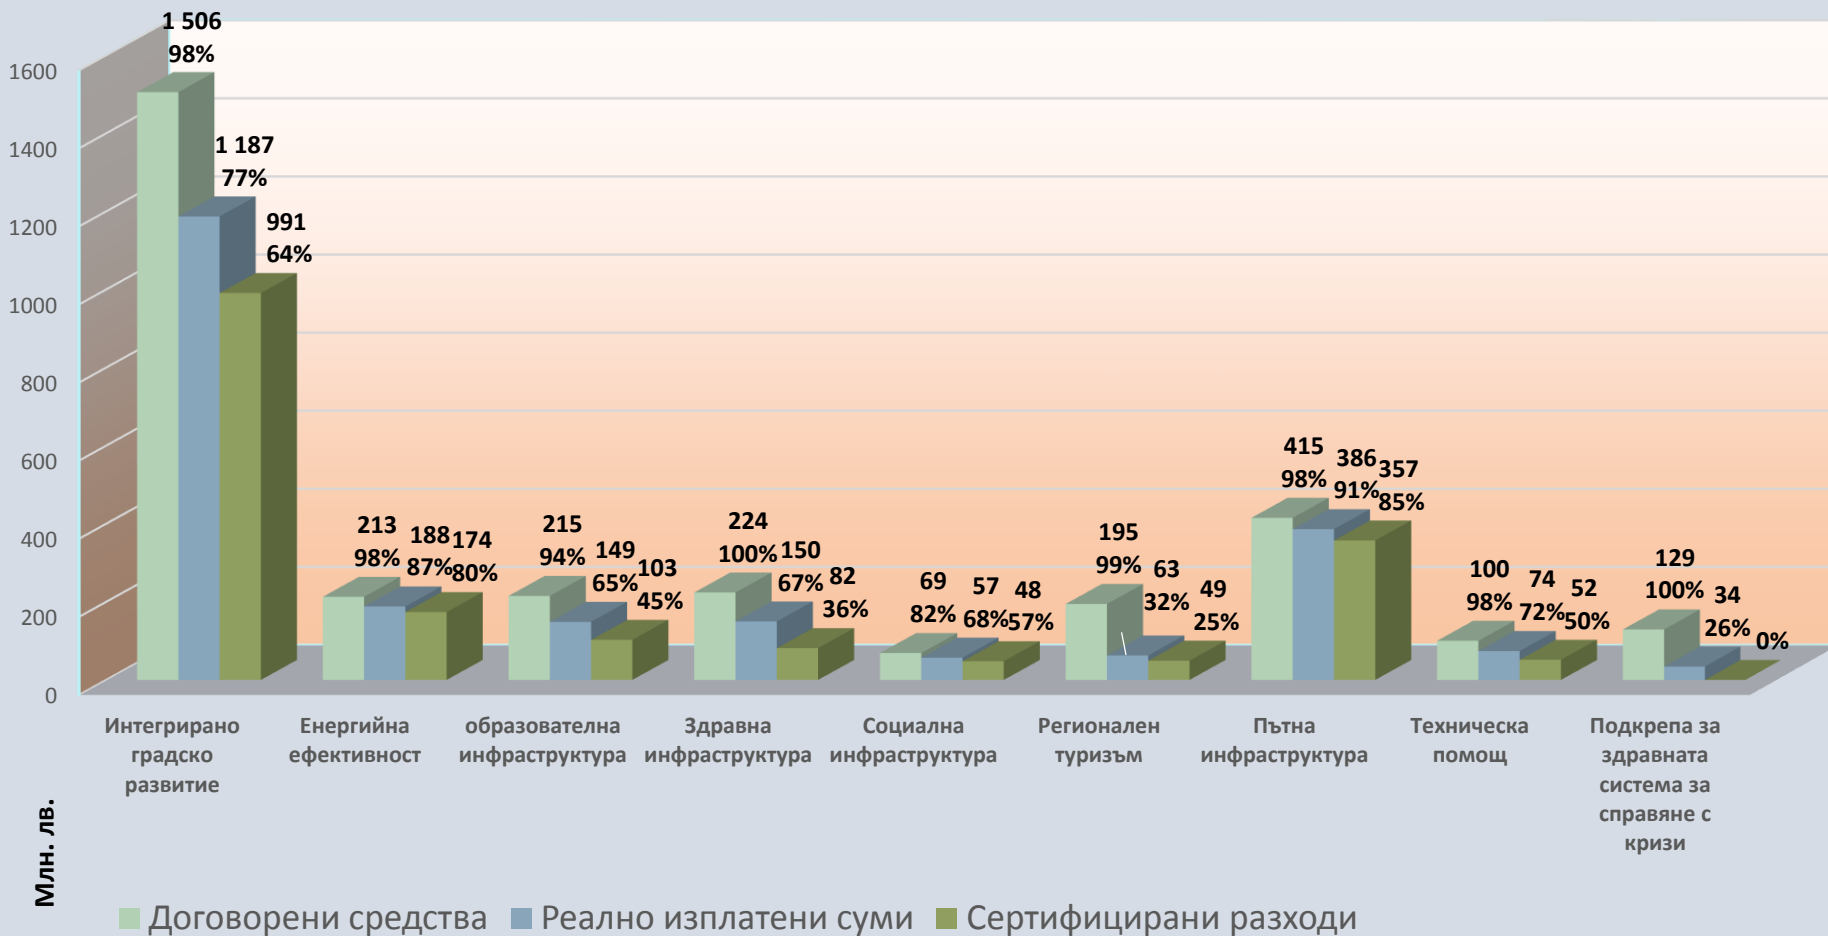

За допълнителна информация по отношение на актуалната степен на изпълнение на програмата може да посетете страницата на <https://www.eufunds.bg/>

РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРР 2014-2020

ПО	Индикатори	Целева стойност по сключени ДБФП	Постигната стойност	Крайна цел 2023 г.	Очакван % на постигане с/о целева стойност по ДБФП	Постигната стойност (в %)
1	Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (kWh/година)	27 181 834	22 534 531,92	17 636 242,00	154,1%	127,8%
	Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (лица)	121 471	101 038	118 794	102,3%	85,1%
	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м)	5 259 863	3 795 386,07	4 045 455,00	130,0%	93,8%
	Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони (кв. м)	152 877	20271,66	94 911,00	161,1%	21,4
	Рехабилитирани жилища в градските райони	1 036	535	632	163,9%	84,7%
	Население, ползващо подобрени социални услуги (лица)	60 367	35 695	13 843	436,1%	257,9%
	Сертифицирани средства (евро)	801 695 863	499 660 872,54	788 249 821	101,7%	63,4%
2	Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (kWh/година)	66 828 230	64 904 100,10	64 285 438,00	104,0%	101,0%
	Сертифицирани средства (евро)	113 498 884	87 577 218,24	110 817 606	102,4%	79,0%
3	Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (лица)	137 349	82 639	132 986	103,3%	62,1%
	Сертифицирани средства (евро)	115 125 124	51 874 738,71	117 429 784	98,0%	44,2%
4	Одобряване на голям проект със започване на строителните работи и доставките за някои от инвестициите	1	1	1	100%	100,0%
	Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки)	400	347	400	100%	86,8%
	Сертифицирани средства (евро)	104 275 194	36 667 246,02	114 499 431	91,1%	32,0%
5	Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процес на деинституционализация	206	153	214	96,3%	71,5%
	Сертифицирани средства (евро)	38 928 074	24 491 746,94	42 986 853	90,6%	57,0%
6	Създаване на финансов инструмент за развитие на туризма. Разработен механизъм за съчетаване на подкрепата чрез ФИ и безвъзмездни средства. Започнали строителни работи за някои от инвестициите	1	1	1	100%	100,0%
	Сертифицирани средства (евро)	100 391 260	25 189 356,96	100 755 882	100%	25,0%
7	Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища (километри)	630,9	445,04	642	98,3%	69,3%
	Сертифицирани средства (евро)	211 209 563	182 634 859,69	216 048 618	97,8%	84,5%

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИКАТОРИТЕ ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ Енергийна ефективност и образователна инфраструктура

Капацитет на подпомогнатата инфраструктура,
предназначена за грижи за децата или образование



Степен на
изпълнение – 85,1 %
Прогноза – 102,3 %

Понижаване на годишното потребление на първична
енергия от обществените сгради (kWh)

Степен на
изпълнение – 127,8
%
Прогноза – 154 %





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИКАТОРИТЕ ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ градска среда



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в
градските райони (кв. м)

Постигнати стойности Ноември 2022 г.

3 795 386,07

Прогноза за изпълнение на база сключени
договори

5 259 863,26

Целева стойност 2023

4 045 455,00



Степен на
изпълнение – 93 %
Прогноза – 130 %

Обществени или търговски сгради, построени или
обновени в градските райони (кв. м)

Постигнати стойности Ноември 2022 г.


20 271,66

Прогноза за изпълнение на база сключени
договори

148 692,59

Целева стойност 2023

94 911,00



Степен на
изпълнение – 21,4 %
Прогноза – 156 %



За допълнителна информация по отношение на актуалната степен на изпълнение на програмата може да посетете страницата на <https://www.eufunds.bg/>

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИКАТОРИТЕ ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ социална инфраструктура

Население, ползващо подобрени социални услуги
(лица)




Степен на
изпълнение – 317 %
Прогноза – 436 %


Степен на
изпълнение – 84,7 %
Прогноза – 173 %



Рехабилитирани жилища в градските райони

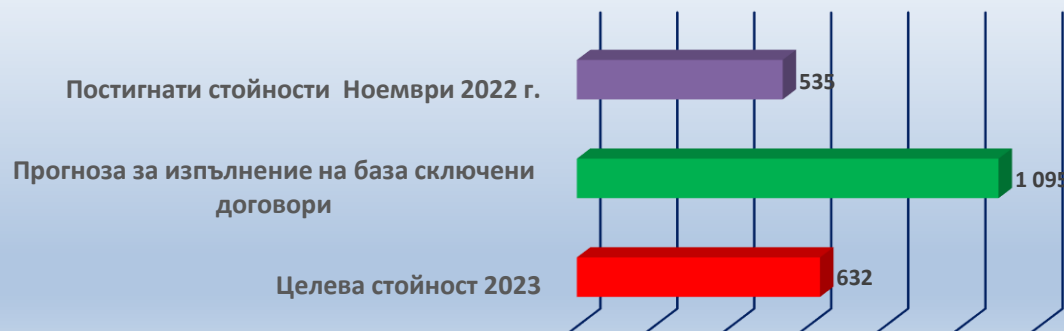

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИКАТОРИТЕ ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

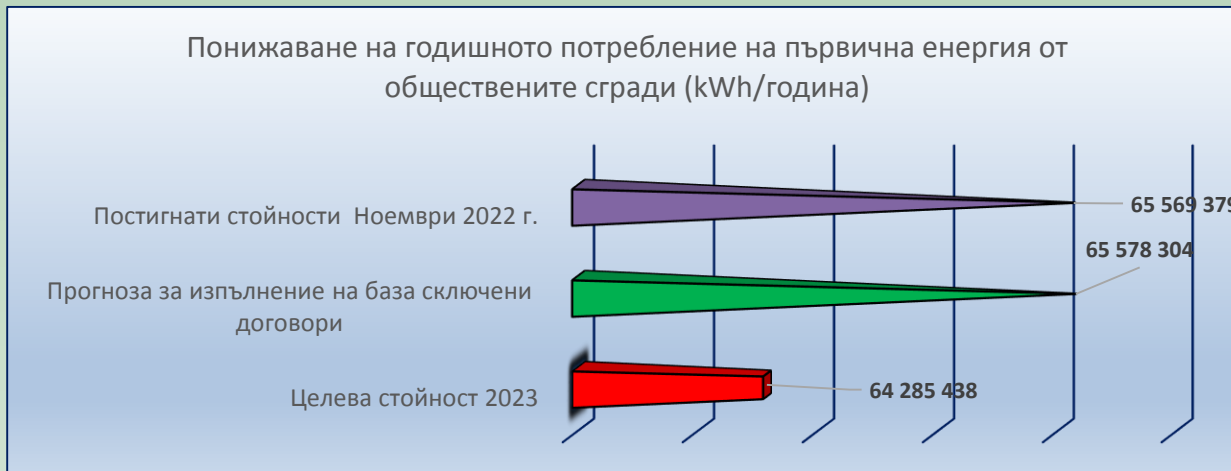


Степен на изпълнение – 99,6 %
Прогноза – 102 %

Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление



Степен на изпълнение – 88,4 %
Прогноза – 115,7 %

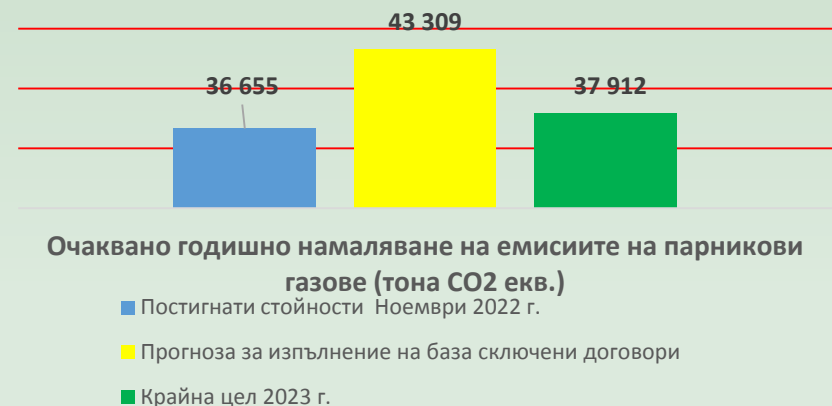

Степен на изпълнение – 96,7 %
Прогноза – 111,4%




НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИКАТОРИТЕ

ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура

Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование

Постигнати стойности
Ноември 2022 г.



Прогноза за изпълнение на база сключени договори



Целева стойност 2023




Степен на изпълнение – 62,1 %

Прогноза – 103 %

ПО 4 „Регионална здравна инфраструктура

Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки)

Постигнати стойности Ноември 2022 г.



Прогноза за изпълнение на база сключени договори



Целева стойност 2023



Проект „Борба с COVID 19“
Апарати за белодробна вентилация за подпомагане на лечението на COVID-19:

Доставени всички 453 апарата.
Верифицирани 190 бр.



НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИКАТОРИТЕ ПО 5 „Регионална социална инфраструктура“

Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процес на деинституционализация



Степен на изпълнение – 74,3 %
Прогноза – 102 %

Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование



Степен на изпълнение – 117 %
Прогноза – 132%



За допълнителна информация по отношение на актуалната степен на изпълнение на програмата може да посетете страницата на <https://www.eufunds.bg/>

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИКАТОРИТЕ ПО 6 „Регионална туристическа инфраструктура“

ПО 6 Регионална туристическа инфраструктура					
Индикатори	Целева стойност 2023	Прогноза за изпълнение на база сключени договори	%	Постигнати стойности Март 2022 г.	%
Сертифицирани средства (евро)	100 755 882,00			25 189 356,96	25,0%


- Изпълнение на 16 от 17 проекта за туристическа инфраструктура с комбинирана подкрепа – безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент. Един договор е прекратен с бенефициент община Троян;
- Проектите са в ход, повечето от които са в ранен етап;
- Цел по схемата за финансови инструменти – подкрепени 18 обекта;
- УО на ОПРР полага усилия и предприема мерки тези проекти да бъдат изпълнени успешно.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИКАТОРИТЕ ПО 7 „Регионална пътна инфраструктура“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Обща дължина на реконструирани или
модернизирани пътища (километри)

Постигнати стойности Ноември 2022
г.

471,00

Прогноза за изпълнение на база
сключени договори

630,9

Целева стойност 2023

642



Степен на изпълнение – 73,4%
Прогноза – 98 %



За допълнителна информация по отношение на актуалната степен на изпълнение на програмата може да посетите страницата на <https://www.eufunds.bg/>



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ ПО ОПРР

Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ - бенефициент Столична община



Реализирани дейности:

- Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо;
- Доставка на 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси;
- Доставка и монтаж на 220 броя електронни информационни табла;
- Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори – Transit signal priority (TSP);

Изпълнение на Компонент 5 „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис" III -24 месеца.

Старт на изпълнението: 09.04.2021 г.

Въведена етапност на изпълнението

- Изпълнение на част А (от пл. „Руски паметник“ до ухо „Княжево“) – **55% изпълнение** (изпълнен изцяло етап 1 – от пл. „Руски паметник“ до ухо „Бъкстон“).
- Изпълнение на част Б (от ухо „Съдебна палата“ до пл. „Руски паметник“) – изпълнение на 100%.

Срок на договора за предоставяне на БФП - 21.11.2023 г.



За допълнителна информация по отношение на актуалната степен на изпълнение на програмата може да посетете страницата на <https://www.eufunds.bg/>

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ ПО ОПРР

Проект № BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие
на системата за спешна медицинска помощ” –
бенефициент Министерство на здравеопазването

Дейност 1 - Изпълнение на СМР:

- ✓ 48 броя договора с изпълнители на СМР за 112 обекта;
- ✓ 24 завършени обекта;
- ✓ **5 прекратени договора за 15 обекта.**

Дейност 2 - Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане:

- Доставено е цялото медицинско оборудване;
- Процедура за избор на изпълнители по реда на ЗОП с предмет „Закупуване на технологично оборудване - за 1 обособена позиция избран изпълнител; 3 позиции прекратена (**предстои нова процедура**)

Дейност 3 - Доставка на медицински превозни средства:

- Доставени общо 357 линейки;

Обществената поръчка „Доставка на линейки за спешна медицинска помощ тип В с повишена проходимост“ (42 бр. линейки.) - **прекратена!!!**

Срок на договора за за предоставяне БФП - 23.12.2023 г.



НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПО ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ

Напредък по изпълнение на ФИ по ОПРР по данни на ФнФ към 10 ноември 2022 г.

- Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Общ портфейл (договорен + индикативен) по ПО1	311 492 712,90 лв.
Общо одобрени по Приоритетна ос 1	234 712 566,85 лв.
Общо договорени за Приоритетна ос 1	228 883 309,26 лв.
Общ разплатени за Приоритетна ос 1	106 030 331,61 лв.
% от ЗЛ договорен + индикативен портфейл по ПО1	132,61%
Общо % Одобрени по ПО1 от ресурса по ОС	99,92%
Общо % Договорени с крайни получатели по ПО1 от ресурса по ОС	97,44%
Общо % Разплатени с крайни получатели по ПО1 от ресурса по ОС	45,14%

- Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“

Общо одобрени по Приоритетна ос 6	15 472 434,00 лв.
Общо договорени за Приоритетна ос 6	15 449 904,00 лв.
Общо разплатени за Приоритетна ос 6	3 747 892,73 лв.
Общо % Одобрени по ПО6 от ресурса по ОС	18,14%
Общо % Договорени с крайни получатели по ПО6 от ресурса по ОС	18,11%
Общо % Разплатени с крайни получатели по ПО6 от ресурса по ОС	4,39%

За допълнителна информация по отношение на актуалната степен на изпълнение на програмата може да посетите страницата на <https://www.eufunds.bg/>

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“: 234,9 млн. лв. за финансови инструменти

1) ФГР София: напредък: наличен ресурс за ФИ по Оперативно споразумение: 70,5 млн. лв.; договорени: 41,7 млн. лв. (59,1%); **разплатени: 23,1 млн. лв. (32,8%)**;

2) ФГР Юг: напредък: наличен ресурс за ФИ по Оперативното споразумение: 82,2 млн. лв.; договорени: 102,2 млн. лв. (124,3%); **разплатени: 55,5 млн. лв. (67,5%)**; портфейл (договорен + индикативен): **121 млн. лв. (147,1%)**

Създадена възможност при необходимост за прехвърляне на ресурс по ФИ между ФГР София и ФГР чрез изменени Оперативни споразумения между ФМФИБ и ДЗЗД ФУГ

3) ФГР Север: напредък: наличен ресурс за ФИ по Оперативното споразумение: 82,2 млн. лв.; договорени: 85 млн. лв. (103,4%); **разплатени: 27,3 млн. лв. (33,3%)**; договорен допълнителен ресурс по ФИ с Анекс № 2 към ОС в размер на 2,7 млн. лв.



За допълнителна информация по отношение на актуалната степен на изпълнение на програмата може да посетите страницата на <https://www.eufunds.bg/>

Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“: 85,3 млн. лв. за ФИ; договорени 15,4 млн. лв. (18%); разплатени: 3,7 млн. лв. (4,39%)

Проблеми при изпълнението на ПО6:

- Изчерпване на БФП с одобрението на 17 проекта;
- Липса на интерес от крайните получатели за изпълнение на проекти изцяло с кредитен ресурс;
- Крайната дата на инвестиране приближава (31.12.2023): няма време за структуриране и изпълнение на допълнителни инвестиции;
- Разплащанията по ФИ се извършват след частта от финансирането по БФП, която финансира дейностите по СМР;
- Необходимост от индексация на ресурса във връзка с повишение на цените на строителните материали;
- Обществени поръчки и срокове за съгласуване с НИНКН.




За допълнителна информация по отношение на актуалната степен на изпълнение на програмата може да посетете страницата на <https://www.eufunds.bg/>

- ❖ Проведени информационни дни в седем области на страната за представяне на изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г.



- ❖ Проведени шест заседания на Регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2

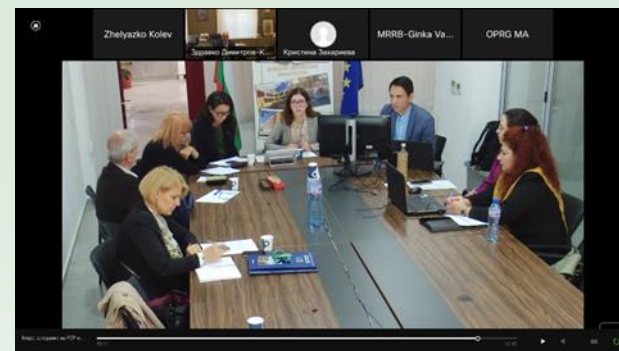

❖ В периода от м. март до декември 2022 г. УО на ОПРР има публикувани над 20 прессъобщения и новини на интернет страницата bgregio.eu и eufunds.bg;

❖ Проект по ОПРР 2007-2013 г. „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“, е сред финалистите в конкурса „Regiostars 2022“ на Европейската комисия.




❖ Проект „Европа в България: общо бъдеще“



❖ МРРБ и УО на ОПРР стартира фотоконкурс на тема „ОПРР обновява и вдъхновява – покажи ни най-добрите обекти от твоя град“. Конкурсът ще продължи до 6 декември 2022 г.



Нова интернет страница на програмата

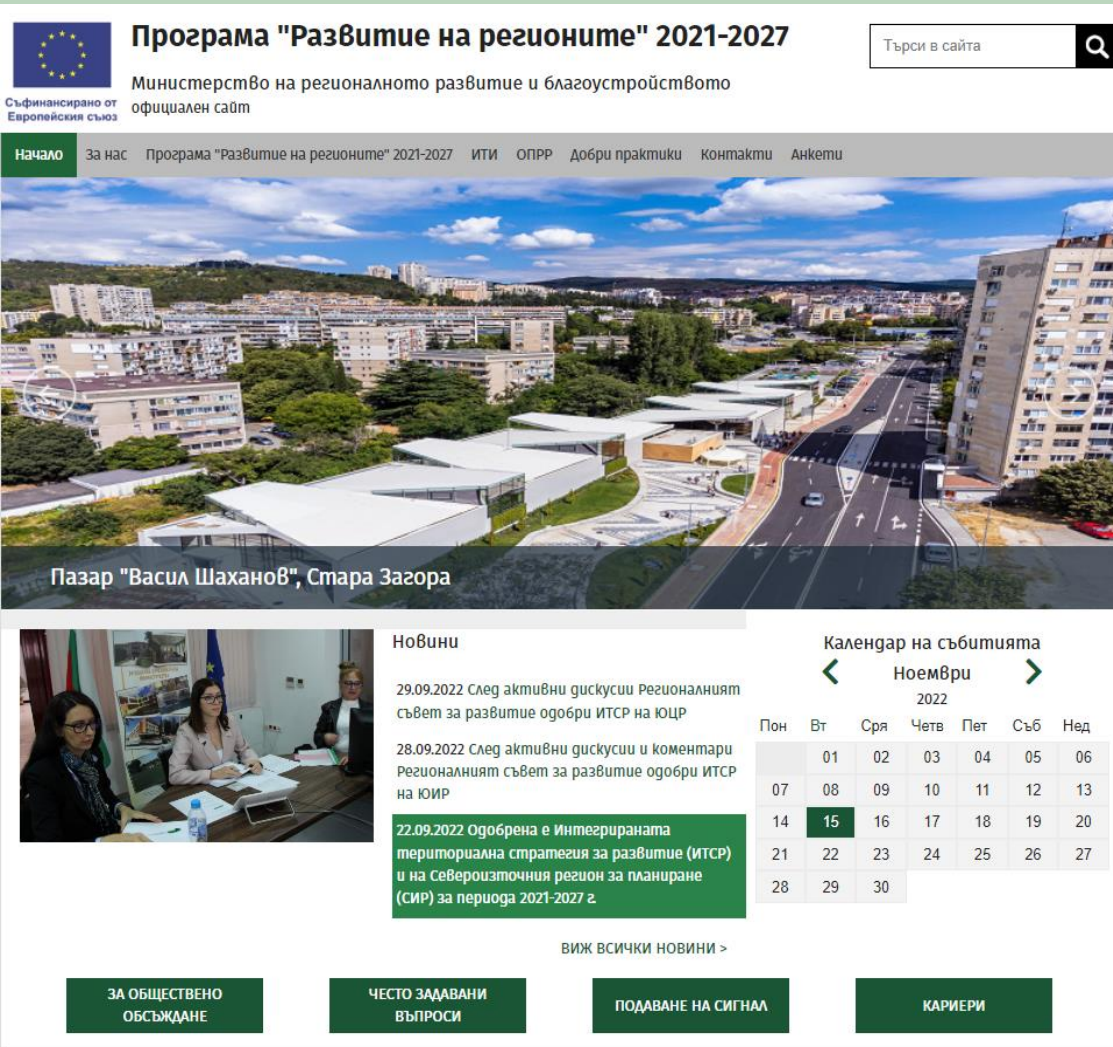

Програма "Развитие на регионите" 2021-2027

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
официален сайт

Търси в сайта

Начало За нас Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 ИТИ ОПРР Добри практики контакти Анкети

Пазар "Васил Шаханов", Стара Загора

Новини

29.09.2022 След активни дискусии Регионалният съвет за развитие одобри ИТСР на ЮЦР

28.09.2022 След активни дискусии и коментари Регионалният съвет за развитие одобри ИТСР на ЮИР

22.09.2022 Одобрена е Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) и на Североизточния регион за планиране (СИР) за периода 2021-2027 г.

Календар на събитията

Ноември 2022

Пон	Вт	Сря	Четв	Пет	Съб	Нед
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

ВИЖ ВСИЧКИ НОВИНИ >

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

КАРИЕРИ

❖ Структурата на сайта е изработена след провеждане на дискусии със заинтересовани страни и партньори, съобразена с всички съвременни изисквания и стандарти за организация;


❖ Основна цел на организацията на информацията в сайта е тя да бъде поместена по начин, който да бъде лесен и логичен за бързо откриване от всеки потребител.



За допълнителна информация по отношение на актуалната степен на изпълнение на програмата може да посетете страницата на <https://www.eufunds.bg/>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Благодаря за вниманието!

30 ноември 2022 г.
гр. Стара Загора
